NATIONAL WATER COMPANY | **شركة المياه الوطنية**

Project Name\ | المشروع/ تلال الغروب

Consultant\ | الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Contractor\ | المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات





شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم • إشراف • تخطيط عمراني • إدارة مشاريع

Work Inspection Request (WIR) | طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works وصف الأعمال	استلام اعمال الحفر + ١٠ سم رمل اسفل المواسير

Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط		Quarter الحي	الأمير فواز	Street الشارع	B10-23	شبكة الري
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 795	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 784		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				

	Yes	No	Not Applicable N/A		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Ø	O	O	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد	
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Ø	O	O	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة	
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Ø	O	O	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة	MAT No. ---------- MIR No. ----------

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة		Signature & Date التوقيع و التاريخ
Issued by المرسل Contractor Representative ممثل المقاول	Name الإسم	محمد عزي
	Signature & Date التوقيع و التاريخ	[signature]
Received المستلم Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الإسم	
	Signature & Date التوقيع و التاريخ	

Stamp: شركة طرق الرياض للمقاولات – س.ت (1010394003) – تلال الغروب - جدة – بلوكات رقم (13-12-11-10-5-3-1) – RIYADH ROADS CONTRACTING

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector) | ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الأسم	محمد عام	Signature & Date التوقيع و التاريخ	[signature]

Action Code

☑	**Approved** يعتمد	☐	**Rejected** مرفوض

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم

Name: محمد عام   Signature: [signature]   Date:

الإسم: التوقيع: التاريخ:

Stamp: مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY | شركة المياه الوطنية





شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

Project Name\ المشروع/ تلال الغروب

Consultant\ الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Contractor\ المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Work Inspection Request (WIR) طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works وصف الأعمال	استلام أعمال تمديد المواسير + ٢٠ سم رمل تحوت المواسير + شريط تحذيري

Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط		Quarter الحي	الأمير فواز	Street الشارع	B10-23	شبكة الري
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 795	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 784		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				

	Yes	No	Not Applicable N/A		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	○	○	○	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد	
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	○	○	○	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة	
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	○	○	○	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة	MAT No. ____ MIR No. ____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة	Signature & Date التوقيع و التاريخ
محمد حمدي محمد	[signature]

Issued by المرسل Contractor Representative ممثل المقاول	Name الإسم	
	Signature & Date التوقيع و التاريخ	[signature] [stamp: RIYADH ROADS CONTRACTING شركة طرق الرياض للمقاولات (1010204003) ... 13-12-11-10-...]
Received المستلم Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الإسم	
	Signature & Date التوقيع و التاريخ	

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)	ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الأسم		Signature & Date التوقيع و التاريخ	

Action Code


☑	Approved يعتمد	☐	Rejected مرفوض

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم	

Name: محمد إمام الإسم: | Signature: [signature] التوقيع: | Date: التاريخ: [stamp: مكتب رمك للاستشارات الهندسية - مشاريع البنية التحتية]

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

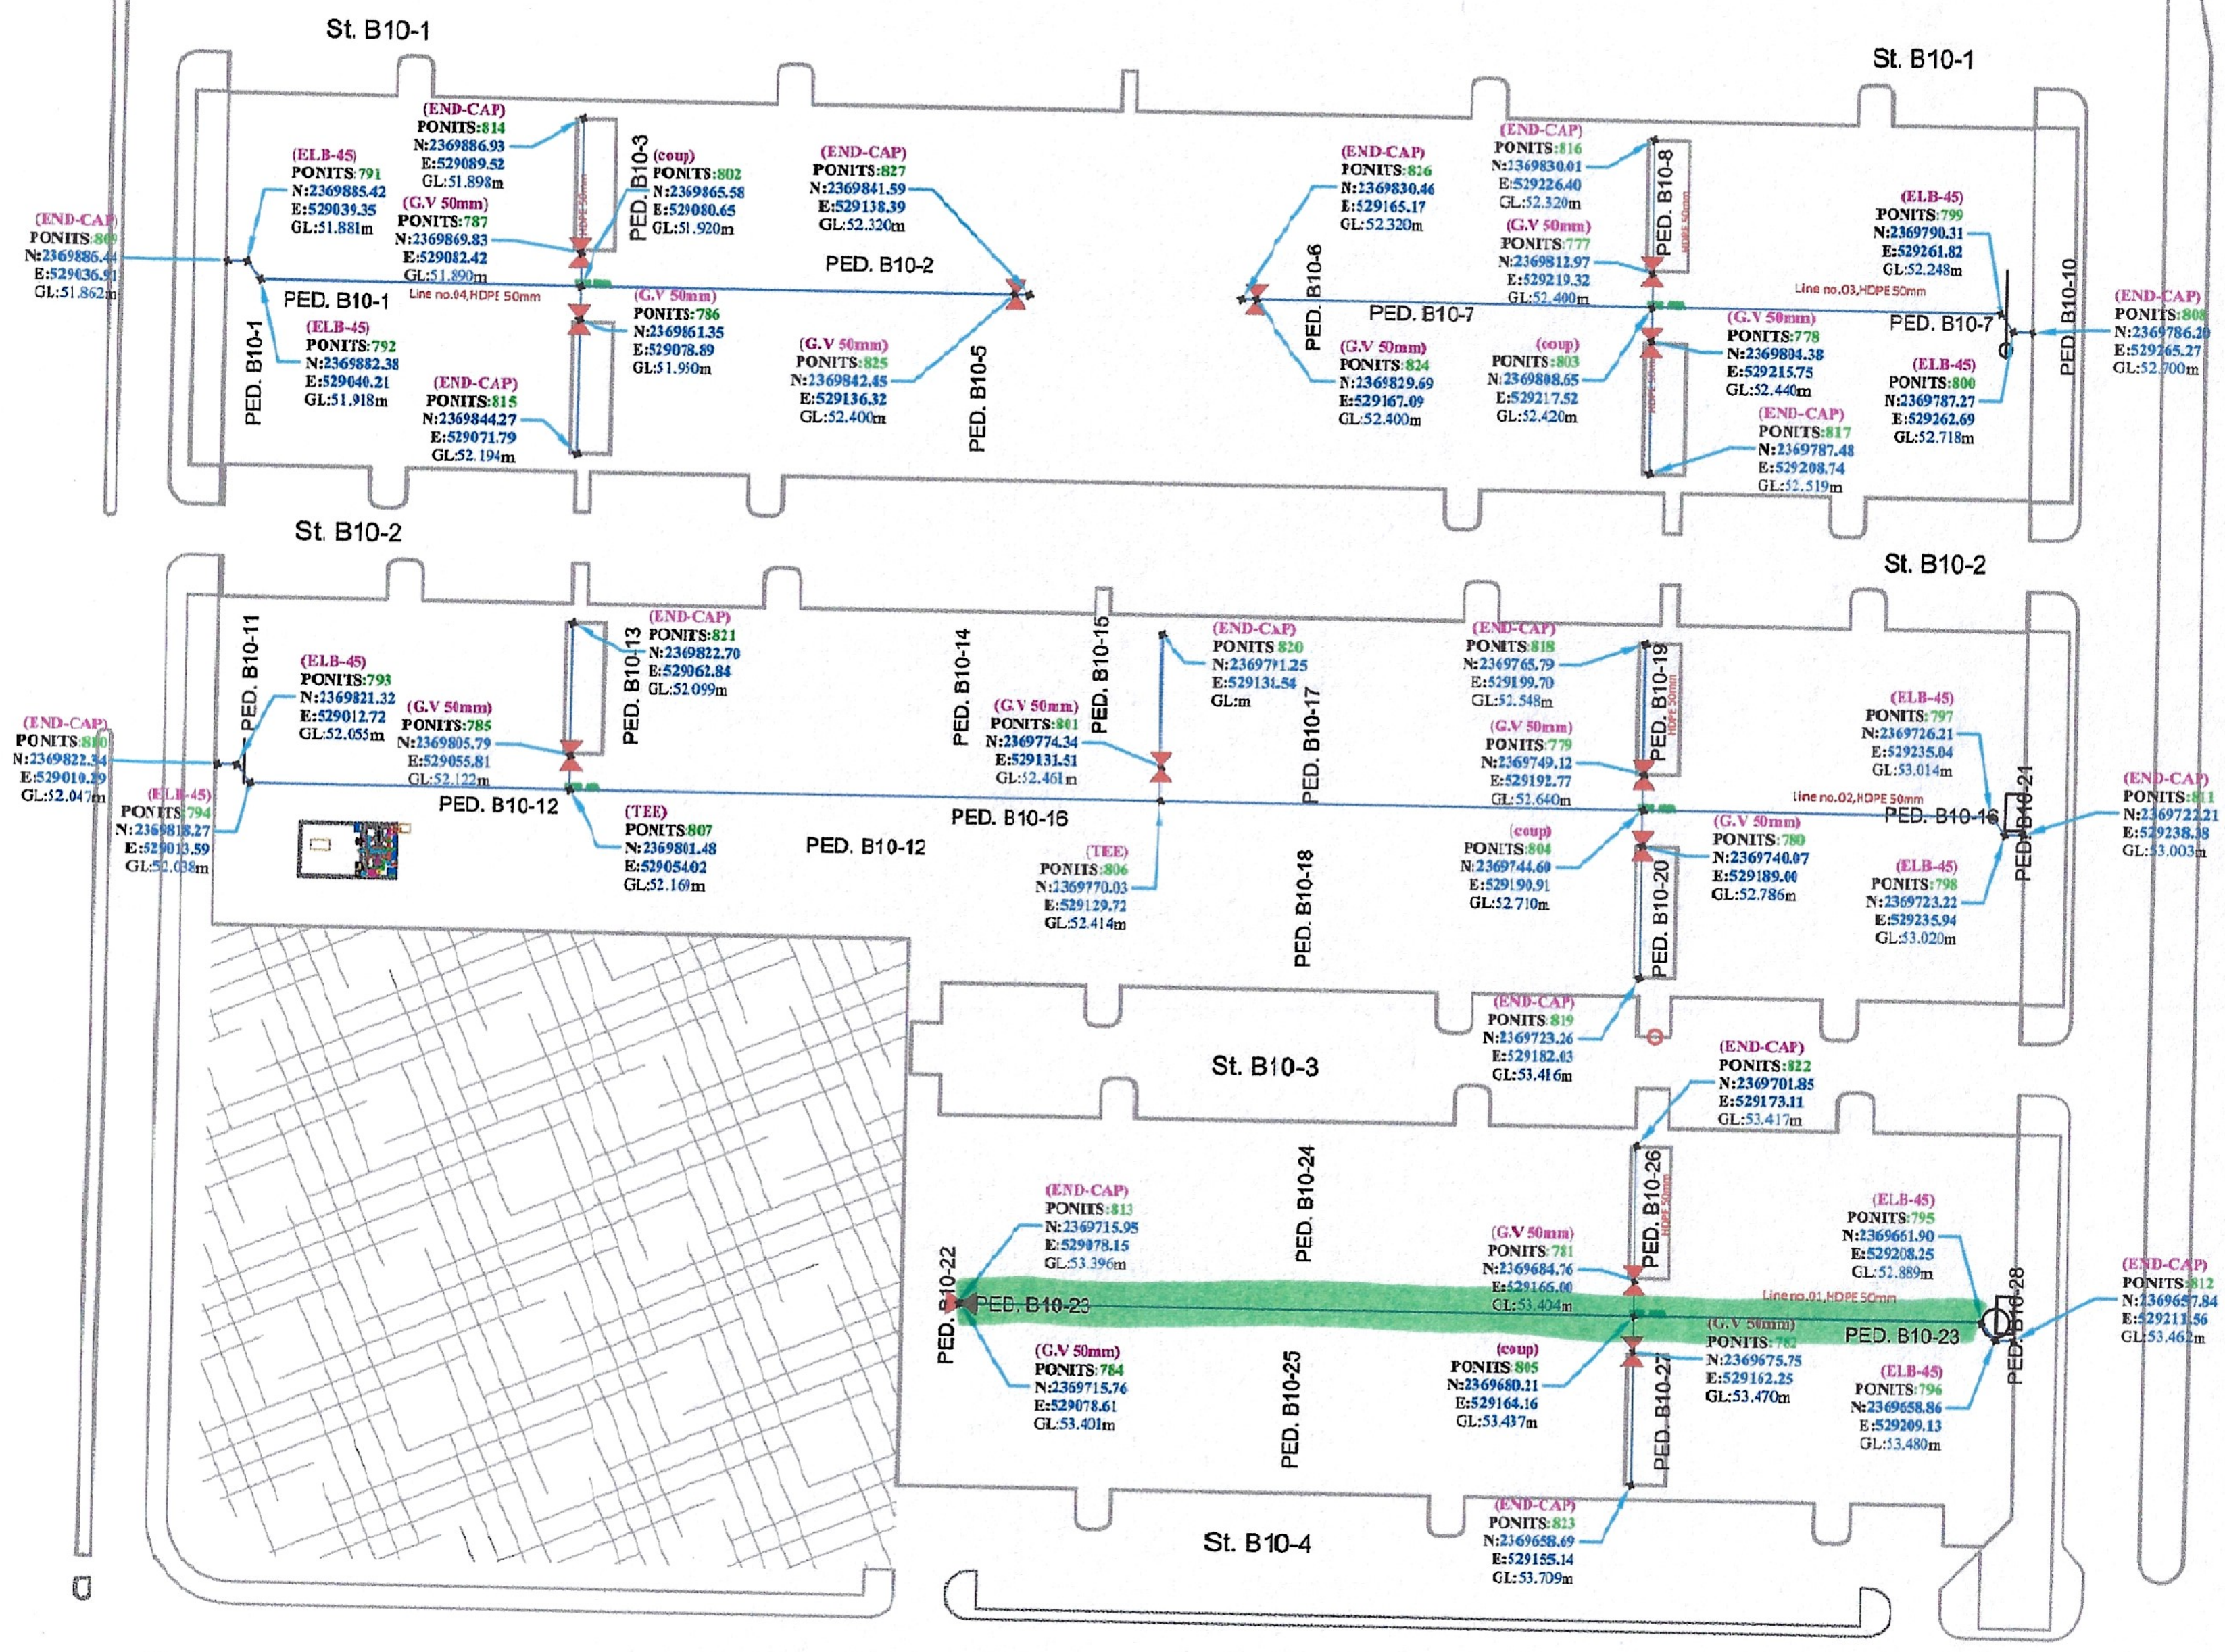

St. B10-1
St. B10-1
(END-CAP)
PONITS:809
N:2369886.44
E:529036.91
GL:51.862m
(ELB-45)
PONITS:791
N:2369885.42
E:529039.35
GL:51.881m
(END-CAP)
PONITS:814
N:2369886.93
E:529089.52
GL:51.898m
(G.V 50mm)
PONITS:787
N:2369869.83
E:529082.42
GL:51.890m
PED. B10-3
(coup)
PONITS:802
N:2369865.58
E:529080.65
GL:51.920m
(END-CAP)
PONITS:827
N:2369841.59
E:529138.39
GL:52.320m
PED. B10-2
PED. B10-1
Line no.04,HDPE 50mm
(ELB-45)
PONITS:792
N:2369882.38
E:529040.21
GL:51.918m
PED. B10-1
(G.V 50mm)
PONITS:786
N:2369861.35
E:529078.89
GL:51.950m
(END-CAP)
PONITS:815
N:2369844.27
E:529071.79
GL:52.194m
(G.V 50mm)
PONITS:825
N:2369842.45
E:529136.32
GL:52.400m
PED. B10-5
(END-CAP)
PONITS:826
N:2369830.46
E:529165.17
GL:52.320m
(END-CAP)
PONITS:816
N:2369830.01
E:529226.40
GL:52.320m
PED. B10-8
(G.V 50mm)
PONITS:777
N:2369812.97
E:529219.32
GL:52.400m
PED. B10-6
PED. B10-7
(G.V 50mm)
PONITS:824
N:2369829.69
E:529167.09
GL:52.400m
(coup)
PONITS:803
N:2369808.65
E:529217.52
GL:52.420m
(G.V 50mm)
PONITS:778
N:2369804.38
E:529215.75
GL:52.440m
(END-CAP)
PONITS:817
N:2369787.48
E:529208.74
GL:52.519m
(ELB-45)
PONITS:799
N:2369790.31
E:529261.82
GL:52.248m
Line no.03,HDPE 50mm
PED. B10-7
PED. B10-10
(ELB-45)
PONITS:800
N:2369787.27
E:529262.69
GL:52.718m
(END-CAP)
PONITS:808
N:2369786.20
E:529265.27
GL:52.700m
St. B10-2
St. B10-2
PED. B10-11
(ELB-45)
PONITS:793
N:2369821.32
E:529012.72
GL:52.055m
(END-CAP)
PONITS:810
N:2369822.54
E:529010.29
GL:52.047m
(ELB-45)
PONITS:794
N:2369818.27
E:529013.59
GL:52.038m
(G.V 50mm)
PONITS:785
N:2369805.79
E:529055.81
GL:52.122m
PED. B10-12
PED. B10-13
(END-CAP)
PONITS:821
N:2369822.70
E:529062.84
GL:52.099m
(TEE)
PONITS:807
N:2369801.48
E:529054.02
GL:52.169m
PED. B10-12
PED. B10-14
PED. B10-15
(G.V 50mm)
PONITS:801
N:2369774.34
E:529131.51
GL:52.461m
PED. B10-16
(TEE)
PONITS:806
N:2369770.03
E:529129.72
GL:52.414m
(END-CAP)
PONITS 820
N:2369791.25
E:529131.54
GL:m
PED. B10-17
PED. B10-18
(END-CAP)
PONITS:818
N:2369765.79
E:529199.70
GL:52.548m
PED. B10-19
(G.V 50mm)
PONITS:779
N:2369749.12
E:529192.77
GL:52.640m
(coup)
PONITS:804
N:2369744.60
E:529190.91
GL:52.710m
PED. B10-20
(G.V 50mm)
PONITS:780
N:2369740.07
E:529189.00
GL:52.786m
(ELB-45)
PONITS:797
N:2369726.21
E:529235.04
GL:53.014m
Line no.02,HDPE 50mm
PED. B10-16
PED. B10-21
(ELB-45)
PONITS:798
N:2369723.22
E:529235.94
GL:53.020m
(END-CAP)
PONITS:811
N:2369722.21
E:529238.38
GL:53.003m
(END-CAP)
PONITS:819
N:2369723.26
E:529182.63
GL:53.416m
St. B10-3
(END-CAP)
PONITS:822
N:2369701.85
E:529173.11
GL:53.417m
PED. B10-24
PED. B10-26
(END-CAP)
PONITS:813
N:2369715.95
E:529078.15
GL:53.396m
(G.V 50mm)
PONITS:781
N:2369684.76
E:529166.00
GL:53.404m
(ELB-45)
PONITS:795
N:2369661.90
E:529208.25
GL:51.889m
PED. B10-22
PED. B10-23
Line no.01,HDPE 50mm
PED. B10-23
PED. B10-28
(END-CAP)
PONITS:812
N:2369657.84
E:529211.56
GL:53.462m
(G.V 50mm)
PONITS:784
N:2369715.76
E:529078.61
GL:53.401m
PED. B10-25
(coup)
PONITS:805
N:2369680.11
E:529164.16
GL:53.437m
PED. B10-27
(G.V 50mm)
PONITS:782
N:2369675.75
E:529162.25
GL:53.470m
(ELB-45)
PONITS:796
N:2369658.86
E:529209.13
GL:53.480m
(END-CAP)
PONITS:823
N:2369658.69
E:529155.14
GL:53.709m
St. B10-4
